Lan Party - BTS SIO

Contexte :
Atelier d'initiation à la planification de projet et au diagramme de Gantt

4 semaines pour mettre la Lan Party en

Gestions des Tâches

Nom	Assignation	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	État
Faire une liste du matériel nécessaire		1				En cours
Établir le budget		1				Terminé
Choisir le lieu		1				Terminé
Fixer la date et la durée		1				Terminé
Définir l'objectif et le format		1				Terminé
Nettoyage et démontage					4	Pas commencé

Nom	Assignation	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	État
🔒 Assurer la sécurité et le confort				3		Pas commencé
🗂️ Organiser les tournois et animations					4	Pas commencé
🍜 Prévoir la restauration et les pauses				3		Pas commencé
💬 Gérer les besoins et la communication				3		Pas commencé
⚠️ Prévoir un plan de secours technique			2			Pas commencé
🌐 Configurer un réseau local partagé			2			En cours
📶 Prévoir une connexion Internet stable			2			En cours
👾 Installer les serveurs de jeu			2			En cours
📡 Préparer l'infrastructure réseau			2			En cours

Gestions des Sprint

Nom	Assignation	Sprint	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	État
📍 Choisir le lieu		1	1				Terminé
📅 Fixer la date et la durée		1	1				Terminé

Nom	Assignation	Sprint	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	État
💶 Établir le budget		1	1				Terminé
📄 Définir l'objectif et le format		1	1				Terminé
🧰 Faire une liste du matériel nécessaire		1	1				Terminé
👾 Installer les serveurs de jeu		2		2			En cours
🧹 Nettoyage et démontage		4				4	Pas commencé
📅 Organiser les tournois et animations		4				4	Pas commencé
🌐 Configurer un réseau local partagé		2		2			En cours
⚠️ Prévoir un plan de secours technique		2		2			En cours
🔒 Assurer la sécurité et le confort		3			3		Pas commencé
📶 Prévoir une connexion Internet stable		2		2			En cours
📡 Préparer l'infrastructure réseau		2		2			En cours
🍜 Prévoir la restauration et les pauses		3			3		Pas commencé
💬 Gérer les besoins et la		3			3		Pas

Nom	Assignation	Sprint	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	État
communication							commencé

Définition des Sprint sur les semaines :

📝 Phase de planification (Semaine 1) – Sprint 1

1. **Définir l'objectif et le format** de la LAN Party.
2. **Fixer la date et la durée** de l'événement.
3. **Choisir le lieu** (salle, local,...) et vérifier son accessibilité.
4. **Établir le budget** global (Pour le coup Budget illimité).
5. **Faire la liste du matériel nécessaire** (tables, câbles, multiprises, chaises, routeurs, etc.).

⚙️ Phase technique (Semaine 2) – Sprint 2

1. **Préparer l'infrastructure réseau** (switchs, routeurs, câblage, IP).
2. **Installer et tester les serveurs de jeu** (versions, mods, stabilité, compatibilité).
3. **Vérifier la connexion Internet** et planifier une solution locale si besoin.
4. **Configurer le réseau local partagé** (fichiers, communication interne, Discord local).
5. **Prévoir un plan de secours technique** (câbles de rechange, adaptateurs, outils).

🧰 Phase logistique et communication (Semaine 3) – Sprint 3

1. **Gérer les besoins et la communication** (formulaire, Discord, affiches, rappel).
2. **Planifier la disposition des postes** et les zones (jeux, repos, restauration).

3. **Prévoir la restauration et les pauses** (snacks, repas, boissons, espace détente).
4. **Assurer la sécurité et le confort** (électricité, ventilation, premiers secours).
5. **Finaliser les autorisations et la logistique générale** (salle, assurance, transport du matériel).

🎉 Phase événement et clôture (Semaine 4) – Sprint 4

1. **Organiser les tournois et animations** (planning des matchs, règles, récompenses ou pas).

(**Superviser l'installation et le bon déroulement** (tests, accueil, ambiance).)

(**Prendre des photos / vidéos** pour immortaliser l'événement et communiquer après.)

2. **Assurer le nettoyage, démontage et bilan final** (retour matériel, retour, tri).

Diagramme de Gantt

Diagramme fait sur **Project Libre** :
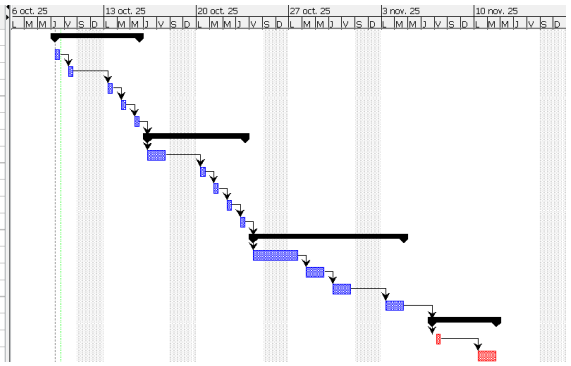
	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	**Phase de planification**	5 jours	**09/10/2025 08:00**	**15/10/2025 17:00**	
2	Définir l'objectif et le format	1 jour	09/10/2025 08:00	09/10/2025 17:00	
3	Fixer la date et la durée	1 jour	10/10/2025 08:00	10/10/2025 17:00	2
4	Choisir le lieu	1 jour	13/10/2025 08:00	13/10/2025 17:00	3
5	Etablir le budget	1 jour	14/10/2025 08:00	14/10/2025 17:00	4
6	Faire une liste du matériel n	1 jour	15/10/2025 08:00	15/10/2025 17:00	5
7	**Phase technique**	6 jours	**16/10/2025 08:00**	**23/10/2025 17:00**	**6**
8	Préparer l'infra réseau	2 jours	16/10/2025 08:00	17/10/2025 17:00	6
9	Installer les serveur de jeu	1 jour	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00	8
10	Prévoir une connexion Intern	1 jour	21/10/2025 08:00	21/10/2025 17:00	9
11	Configurer un réseau local p	1 jour	22/10/2025 08:00	22/10/2025 17:00	10
12	Prévoir un plan technique	1 jour	23/10/2025 08:00	23/10/2025 17:00	11
13	**Phase logistique et commu**	8 jours	**24/10/2025 08:00**	**04/11/2025 17:00**	**12**
14	Gérer les besoins et la comm	2 jours	24/10/2025 08:00	27/10/2025 17:00	12
15	Planifier la disposition des p	2 jours	28/10/2025 08:00	29/10/2025 17:00	14
16	Prévoir la restauration et les	2 jours	30/10/2025 08:00	31/10/2025 17:00	15
17	Assurer la sécurité et le con	2 jours	03/11/2025 08:00	04/11/2025 17:00	16
18	**Phase événement et clôtu**	5 jours	**06/11/2025 20:00**	**11/11/2025 17:00**	**17**
19	Début des tournois et des ar	1 jour	06/11/2025 20:00	07/11/2025 12:00	17
20	Nettoyage et démontage	2 jours	10/11/2025 08:00	11/11/2025 17:00	19
